

# 완 료

## 아태교육원 광장 일대 국제문화예술거리 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-4-3	신규/계속	임기내완료/임기내착수	국/시/구비	문화관광과	공원녹지과, 교통행정과, 건설관리과, 도로과, 치수과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국제문화예술거리조성 - 조형물 및 시설물설치 - 신도림문화환승라운지 조성	조형물 및 시설물 - 패턴보도블럭 - 아치 - 경관조명 등	시설물 설치 - 디자인벤치 - 포토존 - 거리경관조명 등	신도림자전거주차장 구조보강공사 - 토목구조안전진단 - 건축구조안전진단	신도림 문화환승 라운지 조성및개관	-
달성도	50%	75%	85%	100%	-

### ■ 사업개요

- 기 간 : 2017. 3. ~ 2021.
- 위 치 : 구로구 새말로 120 일대(구로5동)
- 규 모 : 신도림역 2번 출구 주변 및 아태교육원 광장 일대 거리(약 1km)
- 내 용 : 상징조형물 및 경관시설(디자인 벤치, 가로경관시설 열주 등)설치  
신도림자전거주차장 2층 '신도림다락' 문화공간 조성

### ■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
목표예산	1,400	22	278	700	400	
국비[특교세]	500	-	-	500	-	
시비	400	-	-	200	200	
구비	200	-	-	-	200	
특교금	300	22	278	-	-	
집행액	1400	22	273	213	112	780

## 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	2021. 4/4 분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18. 7. 25 ~ 11. 28 「국제문화예술거리 조성」사업 1단계 공사 발주               <ul style="list-style-type: none"> <li>•경관조명 열주 설치</li> <li>•아태광장 상징조형물설치</li> <li>•LED버스정류장 설치</li> <li>•소망아치 제작구매</li> <li>•음식문화거리 진입아치 제작</li> </ul> </li> <li>- 18. 12월 : 「국제문화예술거리 조성」사업1단계 완료</li> <li>- 19. 2월 : 「국제문화예술거리 조성」사업 2단계 관련 벤치마킹 실시 및 보고</li> <li>- 19. 6월 : 「자전거주차장 2층 리모델링」 관련 구조안전진단 실시 용역 발주</li> <li>- 19. 8월 : 국제문화예술거리 전기공사 신도림역 2번 출구 앞 환경개선 공사</li> <li>- 19. 10. 22 「국제문화예술거리 조성」사업 2단계 조형물 준공               <ul style="list-style-type: none"> <li>•구로 빛 벤치 (디자인벤치)</li> <li>•풍선조형물 (포토존)</li> <li>•가로경관조명 열주 설치</li> <li>•국제음식문화거리 진입 안내 폴대 설치</li> </ul> </li> <li>- 19. 9월 「자전거주차장내 문화공간 조성 실시설계」 용역 발주</li> <li>- 19. 10월 : 국제문화예술거리 조성 예산 명시이월</li> <li>- 19. 12월               <ul style="list-style-type: none"> <li>•「구로 포토 스팟 만들기」 사업 완료</li> <li>•「신도림역 자전거주차장내 문화공간 조성」설계자문심의위원회 개최</li> <li>•국제문화예술거리 조성 예산 사고이월</li> </ul> </li> <li>- 2020. 2.11 문화환경라운지 기반조사 용역 준공</li> <li>- 2020. 3.12 용역 준공 연기 (2건)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「자전거주차장내 문화공간 조성 실시설계」 용역</li> <li>• (토목)구조안전진단 복원도면 제작 용역</li> </ul> </li> <li>- 2020. 4.20 국제문화예술거리 활성화를 위한               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디자인 환기구 조성 용역 시행</li> </ul> </li> <li>- 2020. 4.21 신도림역 자전거주차장               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축구조안전진단 및 구조보강설계용역 시행</li> </ul> </li> <li>- 2020. 5.26 유네스코 아·태 앞 안내판 설치</li> <li>- 2020. 6.24 신도림역 자전거주차장               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우수지 보강공사 실시설계 용역</li> </ul> </li> <li>- 2020.6. 신도림역 자전거주차장(우수지) 보강공사 실시 설계 용역</li> <li>- 2020.9. 신도림역 자전거주차장 우수지 구조보강공사 실시</li> <li>- 2020.9. 신도림역 자전거주차장내 문화공간 조성 실시 설계 변경</li> <li>- 2020.10.신도림역 자전거주차장 건축구조안전진단 및 구조보강설계용역 준공</li> <li>- 2020.11 신도림역 자전거주차장 리모델링 설계용역완료</li> <li>- 2020.12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축공사 시 계약심사 완료</li> <li>• 기계 및 전기공사 구 계약심사 완료</li> </ul> </li> <li>- 21. 1월 : 신도림역 자전거주차장 문화공간조성(건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 감리) 공사 발주</li> <li>- 21. 8월 : 신도림다락 개관 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-21. 8월 : 국제문화예술거리조성 2단계사업 완료</li> </ul>

## ■ 향후계획


※ 2022년에는 다락을 쉼터 위주로 많은 주민들이 편하게 입장할 수 있는 공간으로 운영할 예정

## ■ 주민소통실적(누적)

연번	구분	주요내용	비고
1	아태교육원 실무회의	.아태교육원앞 조형물 설치 논의	'18.04.11
2	주민설명회	.상설문화전시공간과 공연장 추가 확보 요청 .국제음식거리와 연계한 조형물 설치 요청	'18.04.11
3	보도자료	.구로구, 신도림역 남측에 '국제문화예술거리' 조성 (문화일보, 국민일보, 아시아경제, 서울일보, 매일일보, TBS 등)	'18.12.26

## ■ 관련 사진(누적)


-1단계 조성 현황 사진

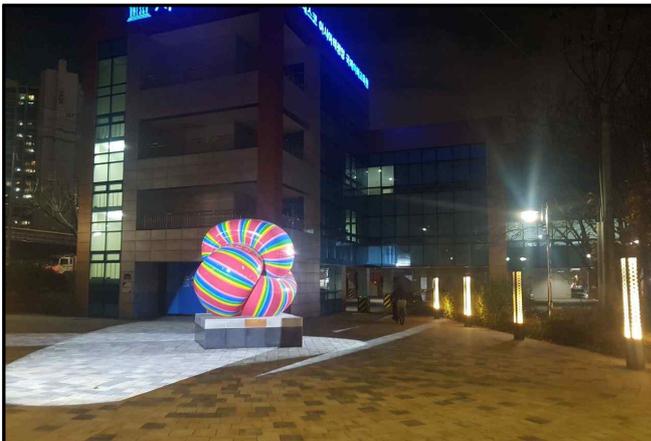

아·태교육원 광장 조형물



국제음식문화거리 진입아치

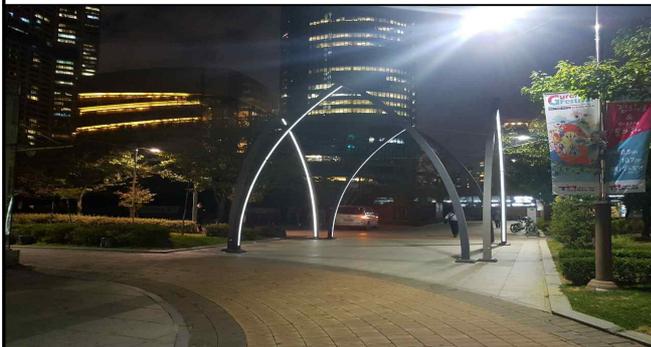

아시아 소망아치



LED버스정류장

- 2단계 조성 현황 및 대상지 사진



가로경관 열주(완료)



국제음식문화거리 진입로 폴대(완료)



신도림 문화공간 다락(외부사진)



신도림 문화공간 다락(내부사진)
